




ANEJO 06: DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

---

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

---

# HELIPUERTO EVENTUAL H24 PARA EMERGENCIAS SANITARIAS EN JACA (COMARCA DE LA JACETANIA)

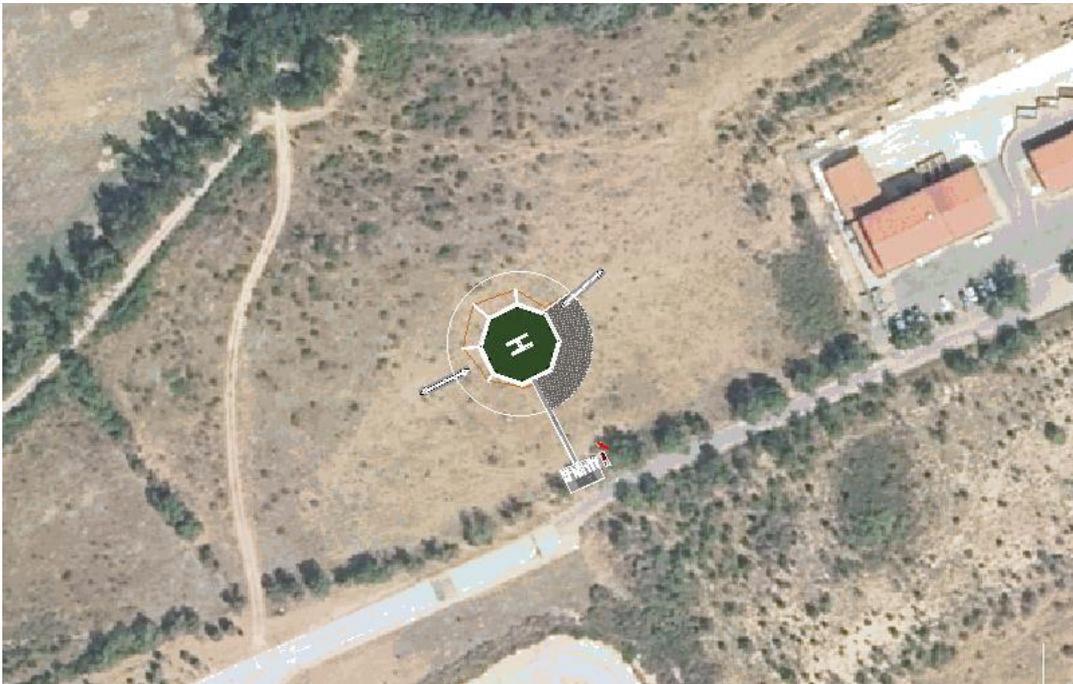

**URJATO**

HE24030

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS HELIPUERTO DE JACA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart																											
							septiembre 2024							octubre 2024							noviembre 2024							diciembre 2024						
0		<b>JACA - HE24030</b>	<b>86 días</b>	<b>lun 02/09/24</b>	<b>lun 30/12/24</b>		[Gantt bar for project summary]																											
1		ACTA DE REPLANTEO E INICIO DE LOS TRABAJOS	1 día	lun 02/09/24	lun 02/09/24		[Gantt bar for task 1]																											
2		CONTACTO PROVEEDORES	1 día	mar 03/09/24	mar 03/09/24	1	[Gantt bar for task 2]																											
3		<b>CONSTRUCCIÓN DE HELIPUERTO</b>	<b>58 días</b>	<b>mar 03/09/24</b>	<b>jue 21/11/24</b>	<b>1</b>	[Gantt bar for task 3]																											
4		<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>12 días</b>	mar 03/09/24	mié 18/09/24		[Gantt bar for task 4]																											
5		<b>OBRA CIVIL</b>	<b>23 días</b>	<b>jue 19/09/24</b>	<b>lun 21/10/24</b>	<b>4</b>	[Gantt bar for task 5]																											
6		ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO	6 días	jue 19/09/24	jue 26/09/24		[Gantt bar for task 6]																											
7		SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-20/B/20/X0 #150x150x6 mm VERT. MANUAL e=15 cm	10 días	vie 27/09/24	jue 10/10/24	6	[Gantt bar for task 7]																											
8		SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-20/B/20/X0 #150x150x6 mm VERT. MANUAL e=10 cm	10 días	vie 27/09/24	jue 10/10/24	6	[Gantt bar for task 8]																											
9		ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=10 cm	5 días	vie 11/10/24	jue 17/10/24	7;8	[Gantt bar for task 9]																											
10		VALLADO HELIPUERTO	2 días	vie 18/10/24	lun 21/10/24	9	[Gantt bar for task 10]																											
11		<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	<b>17 días</b>	<b>mar 22/10/24</b>	<b>mié 13/11/24</b>		[Gantt bar for task 11]																											
12		CABLEADO	7 días	mar 22/10/24	mié 30/10/24	5	[Gantt bar for task 12]																											
13		CUADROS	3 días	jue 31/10/24	lun 04/11/24	12	[Gantt bar for task 13]																											
14		APARAMENTA	7 días	mar 05/11/24	mié 13/11/24	13	[Gantt bar for task 14]																											
15		SAI	2 días	mar 05/11/24	mié 06/11/24	13	[Gantt bar for task 15]																											
16		PROYECTORES	5 días	mar 05/11/24	lun 11/11/24	13	[Gantt bar for task 16]																											
17		MEDICIÓN RESISTENCIA TIERRA	1 día	jue 31/10/24	jue 31/10/24	12	[Gantt bar for task 17]																											
18		<b>AYUDAS VISUALES A LA NAVEGACIÓN</b>	<b>6 días</b>	<b>jue 14/11/24</b>	<b>jue 21/11/24</b>	<b>11</b>	[Gantt bar for task 18]																											
19		LUCES AERONÁUTICAS	6 días	jue 14/11/24	jue 21/11/24	11	[Gantt bar for task 19]																											
20		MANGA DE VIENTO	3 días	jue 14/11/24	lun 18/11/24	11	[Gantt bar for task 20]																											
21		RADIO	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	11	[Gantt bar for task 21]																											
22		<b>SEÑALIZACIÓN Y PINTURA</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 22/11/24</b>	<b>jue 28/11/24</b>	<b>18</b>	[Gantt bar for task 22]																											
23		SEGURIDAD Y SALUD	85 días	mar 03/09/24	lun 30/12/24	1	[Gantt bar for task 23]																											
24		GESTIÓN DE RESIDUOS	85 días	mar 03/09/24	lun 30/12/24	1	[Gantt bar for task 24]																											
25		FIN DE OBRA	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24		[Gantt bar for task 25]																											

Proyecto: JACA - HE24030

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
