ARQUITECTO TÉCNICO REDACTOR:
Raúl García Arango
Colegiado nº1.573

TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIO RECTORADO DE LA U.L.P.G.C.

PROPIEDAD:
SERVICIO DE OBRAS DE LA U.L.P.G

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**TRABAJOS PREVIOS**			
2		Picado de enfoscados	8 días	mié 01/05/19	vie 10/05/19
3		Picado de guarnecidos	11 días	mié 01/05/19	mié 15/05/19
4		**IMPERMEABILIZACIONES**	**7 días**	**jue 16/05/19**	**vie 24/05/19**
5		Impermeabilización en techo de cúpula	7 días	jue 16/05/19	vie 24/05/19
6		**PINTURAS**	**34 días**	**vie 10/05/19**	**mié 26/06/19**
7		Pintura plástica sobre paramentos interiores	34 días	vie 10/05/19	mié 26/06/19
8		Pintura plástica sobre paramentos exteriores	28 días	lun 20/05/19	mié 26/06/19
9		**VARIOS**	**29 días**	**vie 24/05/19**	**mié 03/07/19**
10		Preparación de fachadas	9 días	vie 24/05/19	mié 05/06/19
11		Limpieza final de la obra	3 días	lun 01/07/19	mié 03/07/19
12		**GESTIÓN DE RESIUOS**	**43 días**	**mié 01/05/19**	**sáb 29/06/19**
13		Medidas a adoptar en el Estudio de Gestión de Resíduos	44 días	mié 01/05/19	sáb 29/06/19
14		**SEGURIDAD Y SALUD**	**44 días**	**vie 03/05/19**	**mié 03/07/19**
15		Medidas a adoptar en el Estudio de Gestión de Resíduos	44 días	vie 03/05/19	mié 03/07/19

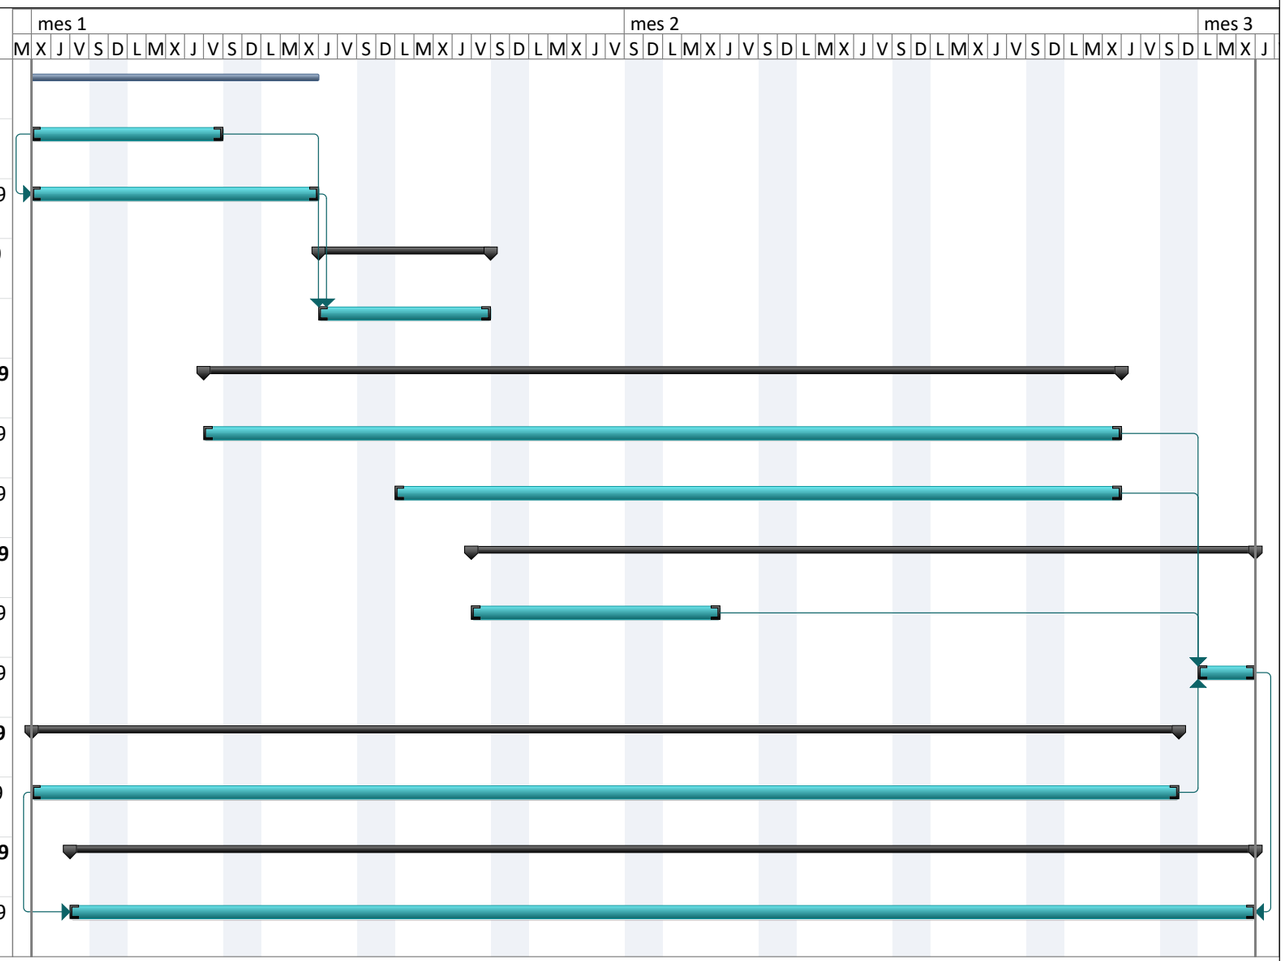

Programaciónde tiempos
Noviembre de 2017

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	
